

Afronding PI-23 en voortgang PI-24 sprint 1



kadaster

Tactische Beheer Organisatie

Digitaal Stelsel Omgevingswet,

2022-10-04




Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-23

	% gerealiseerd van het totaal PI-23	% van wat er gepland was t/m sp6	% gereed en gepland in sp6 alleen
Totaal DSL-LV	94%	94%	61%
Geonovum	88%	94%	13%
Kadaster	90%	92%	54%
KOOP	91%	92%	55%
RWS	101%	94%	65%
Programma	98%	100%	100%

N=genormaliseerd voor het # items per team

N=62%

Burndown grafiek sprint 23.6

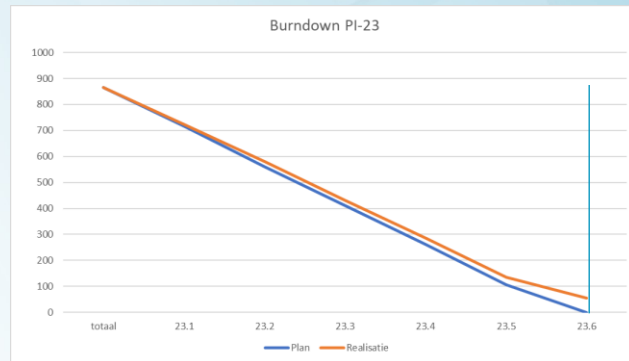

Realisatie op basis van features in de backlog

Totaal DSL-LV	Volgt als validatie gereed
Geonovum	
Kadaster	
KOOP	
RWS	
Programma	

De trend van de latste PI's blijft gehandhaafd. Goed gepland. Dat komt mede ook door de nadruk op robuustheid. Geen nieuwe 'fratsen', veel time-windows en inzet op oefenen wordt niet overvraagd, dus geen onverwachte zaken. Eén van de belangrijkste zaken de downloadfunctie komt na de eerste sprint PI-24.

Verschil Backlog versus Planning. Uiteindelijk gaat het om de realisatie van de functionaliteit. De cijfers over de planning zeggen iets over de voorspelbaarheid. N.B. Hoe komt dat ook alweer?- De verklaring is dat de backlog features bevat en het planbord meer. Daar staan ook bouwstenen van features op (stories). Als een feature uit 10 bouwstenen bestaat en daar zijn er volgens de planning 8 van gerealiseerd geeft dat in de planning een score van 80%, in de backlog 0%. Of de feature dan al bruikbaar is, is per feature verschillend.





Voortgang PI-24, sprint 1 (20/09-04/10)

ALGEMEEN:

Pi-23 is afgerond met een hoge plannings score. De redenen zijn bekend. Weinig echt nieuwe zaken, veel verbeteren van bestaande situatie en veel ondersteuning van oefenen en bugfixing.

Release/Deployment:

Deployment 24.1 is deze sprint gedaan. Wat opvalt is dat ook RWS nu aangesloten is op het per sprint uitrollen(! Succesje!) en dat er nu in korte tijd, meestal dezelfde week uitgerold wordt in PROD, Oefen en Demo omgeving. Deze week zal op vrijdag de Viewer (VRK) uitrol 24.1 sluiten (PI-24 sprint 1) en heeft dan zelfs tweemaal uitgerold in deze sprint.

Risico proces:

1. Risico's PI-24 zijn geïnterpreteerd en de heatmap is nog niet opgesteld. Het voornaamste risico's voor het behalen van het doel van dit PI *"Let's get the party started"* is het politieke strijdtonel waar men vooral de belangen kruist en de ratio in de kluis laat zitten.






Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-24

	% gerealiseerd van het totaal PI-21	% van wat er gepland was t/m sp1
Totaal		
DSO-LV	15%	92%
Geonovum	10%	65%
Kadaster	14%	89%
KOOP	18%	114%
RWS	15%	97%
Programma	11%	75%

N=genormaliseerd
voor het # items
per team

N sprint =94%

Burndown grafiek sprint 24.1

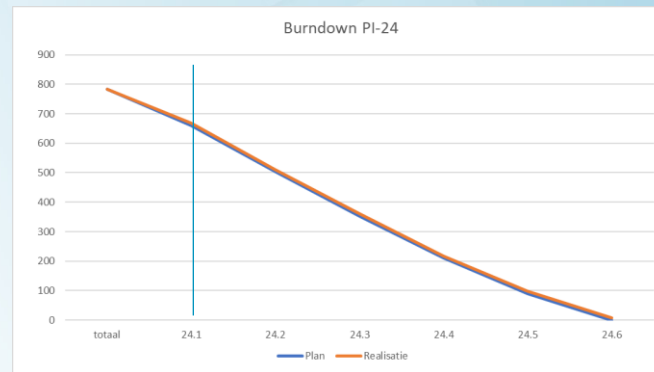

Bevindingen genoemd in PIBO

Kadaster
Geen aanvullingen.

Geonovum
Geen aanvullingen.

KOOP
Geen aanvullingen

RWS
Geen aanvullingen.

Top 3 risico's uit PI-24

1. Rijks content laden in Productie op 15 oktober. Mogelijk heeft de content een verkeerde IWT datum als deze wordt aangepast voor de wet.
Mitigerende maatregel: Er is een plan opgesteld.
2. Personeelsverloop i.v.m. politieke onzekerheid en geen duidelijke perspectieven, werving is moeilijk, tarieven zijn steeds hoger.
Mitigerende maatregel: Nog geen, geaccepteerd als gegeven.
3. Oefenen niet representatief: Non happy-flow wordt onvoldoende beproefd.
Mitigerende Maatregelen zijn te verdelen in:
1) 'Zij in orde' (BG's, Veranderopgaven en Implementatie) en
2) 'Wij in orde' (DSO-LV, pDSO (STOP)).
1) 'Zij in orde': De mate waarin geoefend wordt is aan de BG's zelf. Stimulering van oefenen is m.n. voor Implementatie en Koepels.
2) 'Wij in orde' betreft ook de 'unhappy flow' en dat is m.n. Testen / IKT e/o o.a. Themaweken Geonovum.



Verdieping realisatie per OBO PI-24, sprint 1

Teams	plan 24.1	24.1	%	status	Opmerking
PR33-TPOD	20	13	65%		
PR34-STOP	10	9	90%		
PR30-LVBB	18	23	128%		downloadservice met GIOs werkend, maar verdere testen vereist - diverse bugs issues opgelost
PR2905 Knooppunt	1	1	100%		
PR13U-RTR	0	0	100%		Veel technische stories en bugs.
RWS content	6	8	133%		
UX	8	5	63%		
PR06-Catalogus+IHR	10	9	90%		
PR31-OZON	6	6	100%		Gewerkt aan de ingeplande features voor 24.1. Lopen op koers.
PR02-Loket	0	1	106%		
PR12V-Viewer	6	4	67%		Ontwerpregelingen zijn gereed, toekomstige regelingen is nog onderhanden. Functionele robuustheid: Herinroductie labels op de kaart gereed, inclusief filtering op locatie
VDK+kaartmoter	5	5	100%		
PR12G-Gebr.Toep	14	11	79%		vooral meer tijd kwijt geweest aan toolkit update dan normaal gesproken. Dit doordat er veel breaking changes waren die er ook nog eens voor zorgen dat we ReactLeaflet, Leaflet en React moeten updaten. Mede hierdoor schuift er werk door naar sprint 2 en kunnen een aantal zaken die gepland waren voor sprint 2 niet opgepakt worden, Naar sprint 4 herpland.
Arch.Runway	4	4	100%		Planning is aangepast. Er is wat meer aan boord genomen.
RWS Beheer	9	8	89%		
Monitoring	7	7	100%		Herziening definitieve architectuur (open source alternatieven voor Azure Services). Planning + refinement Q4 op basis van definitieve architectuur. Start migratie + herziening Prometheus/ Grafana. Inhuur en inwerken nieuwe teamleden
totalen	124	114	92%		

Totaal
PI-18 15%



Risico's PI-24 (nog aan te vullen)

Eén is al te duidelijk. Het politieke speelveld en daarbij behorende audits, onderzoeken en meningen.

