



kadaster

Tactische Beheer Organisatie

voortgang PI-24

sprint 4

Digitaal Stelsel Omgevingswet,

2022-11-16



Voortgang PI-24, sprint 4 (01/11-15/11)

ALGEMEEN:

Pi-24 is verloopt volgens planning qua voortbrenging. Het wegvallen van een aantal features mbt het uitstel van de IWT leidt niet tot heel veel ruimte in de planning. Het zijn vooral kleinere features bij verschillende teams. De ruimte wordt vooral opgevuld met verhelpen van bevindingen uit TMR en IKT.

Release/Deployment:

Deployment 24.4 loopt. Viewers, OZON en LVBB. Als het meezit ook RWS-Wassenaar in de oefen omgeving. Maar waarschijnlijker is dat deze in de week van 28 nov komt omdat er eerst een user-migratie gedaan moet worden waardoor de uitrol pas na IKT kan. Dat is dan na volgende week. Volgende week weer IKT testen.

Restant van de 'Veenendaal' release was een usermigratie om de users netjes in te delen in verschillende categorieën (bv pkio users, systeem users, 'loketusers' enz). Deze migratie is randvoorwaardelijk voor de verdere uitrollen. Aangezien de Wassenaar release een belangrijke fix bevat is het van belang deze migratie en de uitrol snel te doen. De afspraken met IKT (niet uitrollen tijdens testperiode) verhinderen nu echter de voortgang van deze fix.

Risico proces:

1. Er is inmiddels een voorgenomen datum IWT: 1 juli 2023. Op dit moment wordt de planning daarnaartoe uitgelijnd, maar een zekerheid lijkt het nog niet, als we denken aan bijvoorbeeld financiële middelen, zaken als implementatie, wetgevingstraject en andere gerelateerde consequenties van het uitstel. De top 3 risico's is nog dezelfde als de vorige sprint.






Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-24

	% gerealiseerd van het totaal PI	% van wat er gepland was t/m sp3	% gereed en gepland in sp3 alleen
Totaal DSO-LV	66%	94%	81%
Geonovum	60%	96%	86%
Kadaster	66%	94%	80%
KOOP	64%	97%	86%
RWS	72%	94%	81%
Programma	66%	87%	60%

N=genormaliseerd voor het # items per team

N sprint =80%

Burndown grafiek sprint 24.4

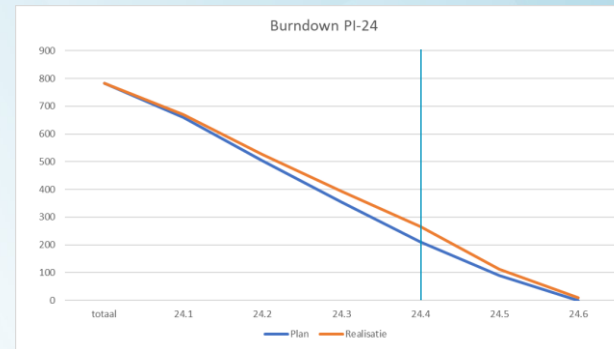

Bevindingen genoemd in PIBO

Kadaster
Geen aanvullingen.

Geonovum
Geen aanvullingen.

KOOP
Geen aanvullingen

RWS
Geen aanvullingen.

Top 3 risico's uit PI-24


- [IWT] Als het DSO-LV door BG/software leveranciers anders gebruikt wordt dan bedoeld, kan het leiden tot onwerkbare situaties.
Mitigerende maatregel: Helderheid verkrijgen op het daadwerkelijke gebruik van (functionaliteiten van) DSO-LV. Handboek voor BG's; Wat te doen bij aansluiten en implementeren. Handleiding voor gebruik van Toepasbare Regels.
- [IWT] Er komt verkeerde content via de planketen in het stelsel
Mitigerende maatregel: Validaties in het stelsel checken, afstemmen of aanvullen. Verbeteren van foutmeldingen. Pro-actief inspelen op vragen en issues die BG, leveranciers en stedenbouwkundige bureaus ervaren. Proces verwerken/implementeren waardelijsten vaststellen. Complexe oefen-/testscenario's opstellen i.c.m. OBO's en (laten) oefenen / intensief testen. Brede communicatie met gebruikers vanaf Q3/Q4 2022.
- [IWT] Geen continuïteit in dienstverlening door gebrek aan kennis en mensen'
Mitigerende maatregel: Duidelijkheid verkrijgen omtrent de financiering



Verdieping realisatie per OBO PI-24, sprint 4

Teams	24.3	plan 24.4	24.4	%	status	Opmerking
PR33-TPOD	87%	21	18	86%		
PR34-STOP						• Uit de versiebeheer afstemming tussen STOP, IMOW en OZON is gebleken, dat het volledige versiebeheer van STOP 2.0 te uitgebreid is voor IMOW/OZON. IMOW/OZON kiezen voor een beperkter versiebeheer voor IMOW. Hierdoor is het afmaken van STOP 2.0 niet afhankelijk van IMOW/TPOD en omgekeerd.
PR30-LVBB	90%	11	10	91%		
PR2905 Knooppunt	89%	18	15	83%		Vooral gewerkt aan robuustheid en diverse bugs
						ebMS-refactoring is afgerond.
	100%	5	2	40%		eHerkenning ketenmachtigingen schuift door (aanpassing in ontwerp nodig)
PR13U-RTR	0%	2	2	100%		Schaalbaarheid IAM: schuift door, prio ligt bij Database as a Service.
RWS content	90%	7	6	86%		Disaster recovery: afhankelijkheid met Database as a Service
UX	78%	13	8	62%		
PR06-Catalogus+IHR	94%	14	12	86%		
PR31-OZON						Correlatie id in de keten afgerond.
	60%	8	4	50%		Demand viewer & correlatie ID in de keten hebben scope uitbreiding gekregen, daarom verplaatst naar sprint 5.
PR02-Loket	40%	4	1	25%		diverse urgente bevindingen opgepakt in overleg met stakeholders.
PR12V-Viewer	88%	7	6	86%		
VDK+kaartmoter	100%	6	6	100%		Merge ingelopen. Eerste versie van compacte (juridische) weergave en tonen van normwaarden gereed.
PR12G-Gebr.Toep	87%	19	18	95%		
Arch.Runway	100%	7	4	57%		
RWS Beheer	55%	11	10	91%		
Monitoring	100%	7	7	100%		
totalen	85%	160	129	81%	Tot PI	66%





- 1. Stabiliteit en Robuustheid
- 2. Ondersteunen van het oefenen
- 3. Ontwikkelen van functionaliteit
- 4. [IWT] Exploitatie risico OBO



actuele periode Sprint 4										periode	
										5 Sprint 4	
ID	Risico	eigenaar	toelichting onzekerheid	toelichting impact	score	mutatie	toelichting en actie	toelichting en actie	toelichting en actie	toelichting en actie	
1	4.1	[IWT] Als het DSO-LV de of BG/software leveranciers anders gebruikt wordt dan bedoeld, kan het leiden tot onwettbare situaties.	[RWS] Implementatie	naarzak onzekerheid DSO-LV wordt gebruikt door BG/softwareleveranciers op een andere manier dan verwacht (voorbeeld: geen laghe structure van taakbare regels of aan-instellingen van Omgevingsdata of RTR database volledig laden op reguliere basis)	De gevolgen kunnen zijn dat het DSO-LV wordt als onwettbaar ervaren door de vergunningaanvrager (bijv. foutieve vergunning wordt verleend, er kan foutief geen vergunning verleend worden) of door de vergunningof houder (bijv. vergunningaanvraag komt bij de verkeerde behandelde aam) of dat de performance slecht worden(het systeem anders) gaat.	4	5	20			
2	4.2	[IWT] Er komt verkeerde content via de planken in het stelsel	Geonovum, Erik	o.a. kennis van toepassing van TPOD onvoldoende (o.a. antwoorden), te weinig goed-fund-getest, validele omstandigheden niet sluitend genoeg, afspraken over implementatie waardenlijzen niet gemaakt.	[I] inconsistenties LVBB-ZDN, Reparatiewerk achteraf; [2] foutieve content niet of slecht te verwijderen; [3] helpdesken en 2e lijn overbelast met issues en vragen	4	5	20			
3	4.3	[IWT] Geen continuïteit in dienstverlening door gebrek aan kennis en mensen	(Geonovum) BZK	Uitblijven afspraak structurele financiering Geonovum voor beheer TPOD	Achteraf (vende dienstverlening	5	4	20			
4	4.4	[IWT] Vanus RWS gevme we aan dat in een periode van live gang het niet verantwoord is om te bezuigen. De functionarissen en gebruikersvriendelijkheid van DSO-LV heeft in aanvang een minimumniveau en we verwachten dat er door operationeel gebruik een vroegrijf aantal bevoegd gezagen en gebruikers gaat volgen met nieuwe urgente issues in een complexe keten.	[RWS] BZK	Bezuigingsmogelijkheden zonder dat de grondslag, namelijk de of fete-annuag voor het implementatiejaar wijzigt.	In de operationele fase geen stabiele beheer-situatie voor het oplossen van issues, door ontwikkeling en uitbouw en in het rewerkingsretraagfase suboptimale implementatieomstandigheden aan bevoegde gezagen.	4	4	16	@Pieter/Marjanne sluiten "15 november een afstemming / toelichting met de Kiepers op het punt van Budgetten 2023) en verder >>Offertes in behandeling in het OGB-B.		
5	7	4.5	[IWT] Door de ruime in de standaard of door het ontbreken van goede afspraken met softwareleveranciers op. Bevoegde gezagen kunnen er in productieplannen worden gevond die we niet of slechts met grote moeite door de keten krijgen.	Kadaster	Softwareleveranciers raken de grenzen van het stelsel	Inconsistentie in de content van het stelsel, performantieproblemen, onbeschikbaarheid van componenten.	4	3	12		
6	7	4.6	[IWT] De situatie zoals genoemd in VVK is niet hetzelfde als in de LVBB	Kadaster	Er is et niet in de tijd tussen de bekendmaking in de LVBB en de publicatie van een nieuwe content in VVK	VVK toont niet de feteleke juridische status	4	3	12	Communicatie / Verwachtingsmanagement (i.e. Servicekosten SA) staat 15 nov op de agenda bij een SK-overleg.	
7	7	4.7	[IWT] Er komt niet-uniforme content in het stelsel / 'dialect' per leverancier.	Kadaster	Standaard biedt (beveel) ruimte voor leveranciers	(Ontstaan van een 'dialect' per leverancier) waardoor Plan-Plan-uitvoering en het oort-overeenstemmen naar andere leveranciers moeilijk wordt.	5	1	1	1 onzekerheid met betref onzake	
8	4	4.8	[IWT] Het is onbekend wat de impact van de ondersteuningsvraag aan het (RWS) TBO PM omen stelsel (StedL, LAYS, Wow...) zal zijn en welke eventuele nieuwe verzoeken het gebruik van Open Stelsel zal genereren.	Geen nu/ni. over hoe het Open Stelsel goed ontwikkelen	Capaciteit tekort ten opzichte van de vraag	4	4	16	14 nov bespreken, Vuurstel is om het risico bij te stellen naar Kert+1. Want KODP en Kadaster zijn inmiddels bekend met alle 'dialecten' bij de leveranciers (bijkand van deze dienstverleningsoverleg). Vuurstel is ook om dit risico over te dragen aan de Veranderingsgave (Erwin Kruimer) @Wen. 1 Vanus DSO-LV / LVBB mag er geen wijziging gedaan worden van de omgevingsdocumenten. Dit moet gedaan worden in de 'bron applicatie'.		
9	4	4.9	[IWT] Onduidelijkheid of alle DSO-LV systemen, in ofaces on onderliggende externe dienst en/afhankelijkheden actief automatisch bewaakt worden op ontstaan van problemen.	PM	het is bekend dat we hier nog stappen te zetten hebben, er zijn diverse incidenten geweest die voortkomen hadden kunnen worden of minder lang hadden hebben duren	Gebruikers, onnodig of onnodig langdurige onbeschikbaarheid onbruikbaarheid van de DSO-LV. Beheroegmaties: geschoudelekele incidenten ontstaan of te lang duren, terwijl de basale beheermaatregelen niet in place zijn.	4	4	16		
10	7	4.10	[Ontwikkeling] De capaciteit van de teams is onvoldoende voor de extra vraag rond IWT.	Sr Supply	Teams zijn niet op sterke	Plannen worden niet gehaald	4	3	12		
11	14	4.11	[Ontwikkeling] De druk op de planning voor PI-24 is enorm vanwege de onwettelijke decembermaand.	PM	Mogelijk onvoldoende tijd gepland voor onwettelijke zaken/verzoeken	Er is daardoor niet veel ruimte voor verstoringen / issues of onwett.	5	1	1		
12	10	4.12	[Ontwikkeling] Het politieke proces en de onzekerheid oment de IWT datum wordt verlamd voor BG's, kopels en Ontwikkelteams.	Prag/Dir.			5	3	9		
13	10	4.13	[Ontwikkeling] Kennis van TPODs en bevindingen.	Implementatie / Ver-oggeve			5	3	9		
14	10	4.14	[Ontwikkeling] TAM's: Impact capaciteit onbekend + uitvoerbaarheid.	Implementatie	Onbekend wat nog op ontwikkelteams	Impact op planning onbekend	5	3	9		
15	14	4.15	[Ontwikkeling] Vanwege het ontwikkelen in te wane brane her' bestaat de kans dat onwettelijke componenten onvoldoende integreem vanwege het niet integraal [Ontwikkeling] kunnen testen en ontwikkelen in de onwettelijke periode (december en januari).	Sr Supply			5	1	1		
16	10	4.16	[Ontwikkeling] Oefenen is niet representatief (o.a. aanstellen on complexiteit). Waardoor niet happy flow onvoldoende wordt beproefd.	Implementatie / Ver-oggeve	Onvoldoende complexe oefeningen beproefd	De niet happy flow (na LVBB) wordt onvoldoende beproefd	5	3	9		
