

Afronding PI-24 en voortgang PI-25 sprint 1



kadaster

Tactische Beheer Organisatie

Digitaal Stelsel Omgevingswet,

2023-01-10


Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-24

	% gerealiseerd van het totaal PI-24	% van wat er gepland was t/m sp8	% gereed en gepland in sp6/7/8 alleen
Totaal DSL-LV	100%	96%	82%
Geonovum	77%	97%	70%
Kadaster	103%	98%	90%
KOOP	100%	96%	84%
RWS	114%	97%	84%
Programma	94%	89%	62%

N=genormaliseerd voor het # items per team

N=87%

Burndown grafiek sprint 24.6/7/8

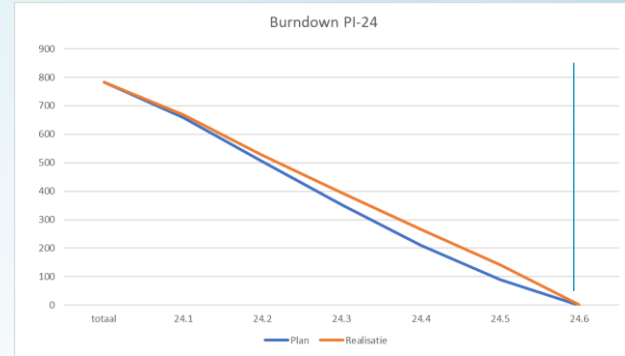

Realisatie op basis van features in de backlog

Totaal DSL-LV	Volgt als validatie gereed
Geonovum	
Kadaster	
KOOP	
RWS	
Programma	

De trend van de latste PI's blijft gehandhaafd. Goed gepland. Dat komt mede ook door de nadruk op robuustheid. Geen nieuwe 'fratsen', veel time-windows en inzet op oefenen wordt niet overvraagd, dus geen onverwachte zaken. Eén van de belangrijkste zaken de downloadfunctie komt na de eerste sprint PI-25.

Verschil Backlog versus Planning. Uiteindelijk gaat het om de realisatie van de functionaliteit. De cijfers over de planning zeggen iets over de voorspelbaarheid. N.B. Hoe komt dat ook alweer?- De verklaring is dat de backlog features bevat en het planbord meer. Daar staan ook bouwstenen van features op (stories). Als een feature uit 10 bouwstenen bestaat en daar zijn er volgens de planning 8 van gerealiseerd geeft dat in de planning een score van 80%, in de backlog 0%. Of de feature dan al bruikbaar is, is per feature verschillend.



Afronding PI-24 en Voortgang PI-25, sprint 1 (10/01-24/01)

ALGEMEEN:

Hoera, voor het eerst in 24 PI's de perfecte score van 100%!

Pi-24 is afgerond met een bijzonder hoge plannings score. We hadden 783 acties ('briefjes') gepland en we hebben er 782 gerealiseerd. Natuurlijk mogen we dit even vieren, maar het is ook goed te beseffen waardoor dat komt. Natuurlijk is er goed gewerkt en was het PI langer dan normaal (eindejaar geeft een flink aantal dagen extra). Het PI was aanvankelijk 'slechts' tot de 4de sprint gepland vanwege de vermeende IWT. Doordat de IWT niet doorging is er herpland. Een aantal features is vervallen en een aantal is nieuw toegevoegd. Deze 'metrics' planning is op basis van aantallen. We hebben dus niet exact geleverd wat er aanvankelijk was afgesproken qua functionaliteit, maar in aantal acties ('briefjes'). Een groot deel hiervan is ook geleverde ondersteuning en lopende beheerwerkzaamheden waarvoor vooral uren inzet geldt. Desalniettemin is het de eerste keer dat we 100% scoren en dat is ook gewoon goed. Tijd om ambitieuzer te gaan plannen.... ;-)

Voor PI-25 geldt dat de cijfers nog even een keer met de PO's doorgenomen moeten worden. Op zich zijn er geen bijzonderheden, maar de totaal aantallen na de planning en de sprint1 komen niet overeen. Er is nog het eea aangepast. Op zich kan dat, maar ik moet het dan wel weten. Daarnaast staan er erg veel ondersteunings en gereserveerde tijdblokken in de planning (de helft van de planning). Die planning haal je altijd dus dat vertekent de voortgangscijfers van de voortbrenging.

Release/Deployment:

Deployments 24.7 en 24.8 zijn gedaan en van 25.1 is vanochtend als laatste een nieuwe versie van de VDK uitgerold. Deze zijn vrij geruisloos gegaan. De 25.2 uitrol na de huidige sprint bevat echter een Postgres database migratie waarvoor het nodig is de omgeving waarin uitgerold wordt een dag te alloceren. Voor productie is dat 9 februari, voor de oefenomgeving is dat vrijdag 10 februari. Gelieve hier rekening mee te houden. De migratie is nodig om allerlei losse databases te vervangen waardoor er in de toekomst efficiënter en sneller gewerkt kan worden bij backup en eventuele restore acties. Het betreft meerdere componenten zoals (RTR, Loket, Knooppunt en Gebruikerstoepassing) en daarom is er ook enige tijd nodig om het goed door te testen en is voor de vrijdag gekozen omdat dit doorgaans een rustige dag is qua gebruik en in geval van een calamiteit het weekend gebruikt kan worden om deze te verhelpen. Uiteraard is er tevoren getest en worden er geen problemen verwacht.

Risico proces:

Risico's PI-25 zijn geïnventariseerd maar de heatmap is nog niet opgesteld.






Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-25

	% gerealiseerd van het totaal PI-25	% van wat er gepland was t/m sp1
Totaal DSO-LV	15%	86%
Geonovum	15%	83%
Kadaster	12%	71%
KOOP	18%	112%
RWS	14%	77%
Programma	13%	83%

N=genormaliseerd voor het # items per team

N sprint =86%

Burndown grafiek sprint 25.1

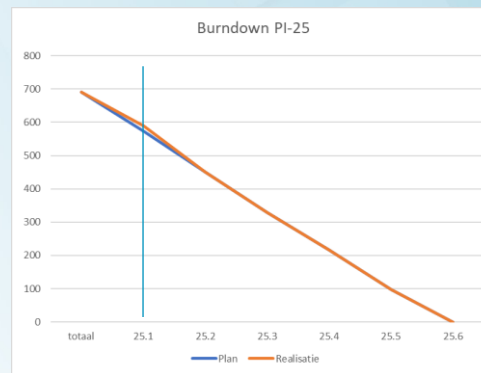

Bevindingen genoemd in PIBO

Kadaster
Geen aanvullingen.

Geonovum
Geen aanvullingen.

KOOP
Geen aanvullingen

RWS
Geen aanvullingen.

Top 3 risico's nog uit PI-24

- [IWT] Als het DSO-LV door BG/software leveranciers anders gebruikt wordt dan bedoeld, kan het leiden tot onwerkbare situaties.
Mitigerende maatregel: Helderheid verkrijgen op het daadwerkelijke gebruik van (functionaliteiten van) DSO-LV. Handboek voor BG's; Wat te doen bij aansluiten en implementeren. Handleiding voor gebruik van Toepasbare Regels.
- [IWT] Er komt verkeerde content via de planketen in het stelsel
Mitigerende maatregel: Validaties in het stelsel checken, afstemmen of aanvullen. Verbeteren van foutmeldingen. Pro-actief inspelen op vragen en issues die BG, leveranciers en stedenbouwkundige bureaus ervaren. Proces verwerken/implementeren waardelijsten vaststellen. Complexe oefen-/testscenario's opstellen i.c.m. OBO's en (laten) oefenen / intensief testen. Brede communicatie met gebruikers vanaf Q3/Q4 2022.
- [IWT] Geen continuïteit in dienstverlening door gebrek aan kennis en mensen'
Mitigerende maatregel: Duidelijkheid verkrijgen omtrent de financiering



Verdieping realisatie per OBO team PI-25, sprint 1

Teams	plan 25.1	25.1	%	status	Opmerking
PR33-TPOD	23	19	83%		
PR34-STOP	11	12	109%		
PR30-LVBB	14	16	114%		Tijdelijk delen Rijk afgerond. Eerste stap SP verkend ('Hello World')
PR2905 Knooppunt	0	0	100%		
PR13U-RTR	1	1	100%		
RWS content	3	1	33%		
UX	12	10	83%		
PR06-Catalogus+IHR	12	8	67%		
PR31-OZON	6	5	83%		Diverse bevindingen opgelost. Gestart met ETRS89
PR02-Loket	1	3	106%		
PR12V-Viewer	5	3	60%		
VDK+kaartmoter	1	1	100%		
PR12G-Gebr.Toep	18	13	72%		In de nieuw te gebruiken webcomponenten blijken helaas in alle situaties fouten op te treden waardoor deze in plaats van een verbetering nu een verslechtering in functionaliteit betekenen. Daardoor kunnen taken voor overgaan op webcomponenten niet worden afgerond. Verder is er nog een uitzoekpunt m.b.t. het aanvragen van een api key voor de bestuurlijke grenzen api, waardoor de validatie van locatie in NL nog niet is afgerond. In de sprint zijn wel 4 andere hinderlijke bugs opgelost die niet waren gepland.
Arch.Runway	0	0	100%		
RWS Beheer	8	6	75%		In 25.1 veel tijd besteed aan exploitatie verplichtingen (o.a. bugs, voorbereiding ebms certificaten, security zaken), deployment van Viewer fix kadaster (onvoorzien) en afronding postgres operator.
Monitoring	3	3	100%		* TMR data analyse en start implementatie * Grafana transactiepunten dashboard uitgefaseerd
totalen	118	101	86%		

Totaal PI-25 15%



Risico's PI-25 (nog aan te vullen)

Eén is maar al te duidelijk. Het politieke speelveld en daarbij behorende audits, onderzoeken en meningen en onzekere IWT datum.

