



kadaster

Tactische Beheer Organisatie

Voortgang PI-26

sprint 5

Digitaal Stelsel Omgevingswet,

2023-06-13



Voortgang PI-26, sprint 5 (30/05-13/06)

ALGEMEEN:

Goed verlopen sprint. We zitten nu op 68% van het PI. De losse teamscores blijven moeilijk te interpreteren doordat er weinig ontwikkelfeatures zijn, maar wel veel werk. Als er dus 0 bij een team staat dan is er geen ontwikkelwerk gedaan maar wel veel aan exploitatie en beheer of ondersteuning van andere zaken. De teams geven aan dat zij hun PI doelen nog steeds kunnen halen. Alleen de Gebruikerstoepassing moet de vorige sprint genoemde features inderdaad doorschuiven door afhankelijkheid met een deel dat het Loket moest opleveren waar een security issue inzat dat eerst gefixt moest worden. Betreft 'verbeteren zoeken' en 'sorteren op meest gekozen activiteiten', die moeten doorschuiven naar volgend PI.

Release/Deployment:

Uitrol 26.5 loopt op dit moment. OZON en LVBB hebben uitgerold en indien de testen goed verlopen zijn wordt ook de Viewer nog gedaan. De RWS-Joure versie is een sprint uitgesteld om de Toepasbare regel leveranciers de kans te geven aanpassingen te maken indien zij die nodig achten.

Wat content betreft staat de DEMO omgeving klaar om de rijksplannen (OR en AMvB's) te kunnen controleren alvorens deze voor 1 juli in productie geladen worden (mijlpaal). Dit traject ligt op schema.

De migratie van KOOP systemen naar het SP loopt iets achter op schema maar maakt wel goede voortgang. Voor de zekerheid zijn afspraken gemaakt met de huidige platform leverancier om het risico van uitloop te mitigeren. Er kan dan nog even gebruik gemaakt worden van het oude platform mocht dat nodig zijn.

Risico proces:

Samenvattend: Voornaamste risico's blijven de afhankelijkheid ondersteunende techniek (COR API en SP) en de onderlinge afhankelijkheid (m.n. Concurrent Versioning)



Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-26

	% gerealiseerd van het totaal PI	% van wat er gepland was t/m sp5	% gereed en gepland in sp5 alleen
Totaal DSO-LV	68%	81%	48%
Geonovum	58%	62%	23%
Kadaster	74%	94%	71%
KOOP	67%	96%	86%
RWS	73%	80%	53%
Programma	80%	89%	67%

N=genormaliseerd voor het # items per team

N sprint =76%

Burndown grafiek sprint 26.5



Bevindingen genoemd in PIBO

Kadaster
Geen aanvullingen.

Geonovum
Geen aanvullingen.

KOOP
Geen aanvullingen

RWS
Geen aanvullingen.

Top 3 risico's

- [DSO] Afhankelijkheid met de COR API van Logius.
Mitigerende maatregel: "Binnen Logius is het beheerproces nog niet volwassen / cq. in lijn met onze processen. De stabiliteit van de nieuwe COR API is nog niet bewezen! @Martin zorgt asap voor een escalatie (via BZK) op een hoger niveau dan PM (mogelijk MarjoleinJ)."
- [DSO] Ontwikkeling Concurrent Version (in de planketen) duurt te lang waardoor het niet gereed is voor STOP B release.
Mitigerende maatregel: Architectuur KOOP en Kadaster versnelt en stelt een notitie op en er wordt gekeken wat van STOP B kan zonder conc version.
- [RWS] Afhankelijkheid van Standaard Platform (SP), totale dienstverlening van SP aan RWS en nakomen van SLA afspraken
Mitigerende maatregel: RWS gaat risico goed beschrijven en een rapport opstellen over de dienstverlening.



Verdieping realisatie per OBO team PI-26, sprint 5


Teams	26.4	26.5 plan	26.5 realisatie	%	status	Opmerking
PR33-TPOD	21%	22	5	23%		Er is veel tijd aan ondersteuning besteed
PR30-LVBB+STOP	29%	7	6	86%		beheerfunctie voor download bekendgemaakte Regelingversies
PR2905 Knooppunt	100%	0	0	100%		Veel beheer werk
PR13U-RTR	0%	2	2	100%		
RWS content	100%	0	0	100%		
UX	0%	3	2	67%		
PR06-Catalogus+IHR	100%	1	0	0%		Zoeken op trefwoorden en implementatie alerts en rapportage harvestproces (tbv FBP) schuiven door en worden in 26.6 opgepakt
PR31-OZON	100%	3	3	100%		Recap sprint 26.5 Registreren V3 verder opgepakt, loopt door in PI27 Diverse bevindingen opgelost Diverse stories tbv toepasbaar API opgepakt Validatie fixes opgepakt.
PR02-Loket	0%	0	0	100%		Veel beheerwerk oa vervanging iFrames
PR12V-Viewer	83%	3	2	67%		
PR12G-Gebr.Toep	30%	15	7	47%		Upgrade Sprintboot doorgeschoven naar PI27 ivm geen Jeager support in Springboot 3. Door meer inzet op performance issues en uitgelopen werk voor Iframes is er minder mogelijk aan webcomponenten. Er is voor gekozen om modal en listbutton te behouden en de rest door te schuiven. Deze twee lossen namelijk enkele WCAG issues op Verder hebben we helaas ook moeten besluiten om het sorteren op meest gekozen werkzaamheden en activiteiten door te schuiven naar een volgend PI.
RWS Beheer	100%	0	0	100%		
Monitoring	100%	0	0	100%		Demo. * Workspace aangemaakt voor Publish to web rapportages (Iedereen heeft rechten) * naast de testomgeving een productieomgeving toegevoegd.
totalen	70%	56	27	48%		

Tot PI **68%**



Risico's PI-26

KRITISCHE EPICS

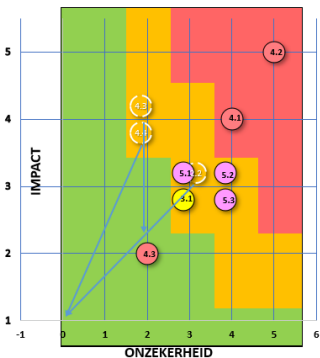

- 1. Oplossen van bestaande risico's met een overtag
- 2. Overdekkende oplossingen en vroegtijdig inzet
- 3. Controleren van risico's, afgeleid van risico's en overtag
- 4. Ontwikkeling van een Kato-Contract
- 5. Anders



actuele periode Sprint 5							periode 6 Sprint 5					
score	voorg	kw	ID	Risico omschrijving	eigenaar	toelichting onzekerheid	toelichting impact	O	I	Sc	mutatie	toelichting en actie
5	5	5	5.1	[KOOP] Migratie naar Standaard Platform	PaulM	Het contract met de huidige provider loopt af en kan niet meer verlengd worden. Dit is niet specifiek maar KOOP breed.	Drie maanden voor en drie maanden na IWT is er geen mogelijkheid voor een transitie van de LVBB naar een nieuwe technische infrastructuur.	3	3	9	6	toelichting en actie 6
2	2	2	4.1	[DSO] Concurrent Version (in de planketen)	Floris, PetervP	De ontwikkeling van Concurrent Versioning gaat te lang gaan duren (te late start en te lange duur)	Nieuwe standaarden (met name STOP B) kunnen niet tijdig worden geïmplementeerd. (bepaalde besluiten kunnen niet binnen DSO-LV worden verwerkt)	4	4	16	6	1. Intensief contact met deskundig architecten en andere specialisten binnen Koop en Kadaster op 6/6/23. Er wordt goede voortgang gemaakt in harmonie er volgt een notitie (Architectuur) en we zijn er bijna. 2. Stelselarchitect maakt analyse wat wel geïmplementeerd kan worden van STOP B zonder dat concurrent versieing compleet gerealiseerd is.
3	1	2	4.2	[DSO] Afhankelijkheid met de COR API van Logius	MartinB	API is niet stabiel genoeg. De planning is onzeker. Wat houdt de nieuwe functionaliteit in?	twee teams van RWS zijn afhankelijk van deze API. Functionele impact op beschikbaarheid geldt ook voor meer dan PI-25.	5	5	25	6	Er wordt op korte termijn een (escalatie) meeting belegd met RWS/KOOP/Logius @Martin De afspraak is nog niet gepland met alle juiste deelnemers. Er wordt ook nog een BreakOut gepland met inhoudelijk betrokkenen. @Danilo
4	7	2	4.3	[KAD] DSO-LV monitoring: er zijn hoge verwachtingen van wat TBO/OBO gaan leveren	ArieD	Onvoldoende duidelijkheid en onvoldoende beschikbaarheid over bron-data	Er wordt niet geleverd wat er verwacht wordt	2	2	4	4	impact omhoog
5	###	2	4.4	[KAD] onduidelijkheid over de dekking van het budget voor de DSO-LV monitoring	ArieD	Onvoldoende helderheid over financiële dekking.	Mocht blijken dat het benodigde budget niet gedekt is moeten we afschalen en kunnen we daarmee minder leveren dan verwacht wordt.	0	0	0	0	onzekerheid omhoog impact omhoog
6	###	2	2.1	[RWS] Het legen van KATO zorgt voor onrust, onduidelijkheid en mogelijk tot niet kunnen testen en zo vertraging oplevert	PM			0	0	0	0	
7	3	2	5.2	[RWS] Afhankelijkheid van SP, totale dienstverlening van SP aan RWS en nakomen van in SLA gemaakte afspraken.	Margriet			4	3	12	6	@Margriet zal deze week het risico scherperstellen. Aanstaande woensdag ligt er mogelijk een rapport over de dienstverlening.
8	5	2	3.1	[DSO] Langdurige hosting voor bepaalde content / figuren	PM		betreft Imgur. Deze content (voor DSO-LV programma m.n. plaatjes in vragenbomen) is na 1-2-2024 niet meer benaderbaar.	3	3	9	6	Er is bekend wie wat moet doen. De leveranciers zijn op de hoogte van de deadline. Nieuwe hostingpartijen moeten worden aangemeld bij IPLD. Bruidsschat-content wordt door DSO-LV zelf aangepast en acties zijn belegd. @Martin plant een 'veegactie' in september.
9	###	2	2.2	[RWS] Het legen van Performance omgeving zorgt voor onrust, onduidelijkheid en mogelijk tot niet kunnen testen en zo vertraging oplevert	PM			0	0	0	0	onzekerheid omhoog impact omhoog
10	3	2	5.3	[RWS] DSO kent performance- en beschikbaarheidsproblemen. [ISSUE]	RWS	divers	DSO is niet of verminderd beschikbaar. Imago- en financiële schade	4	3	12	6	Loadnormen worden getest. Responstijden worden vanuit de PSA's meegenomen. Maar er wordt ook aan nieuwe normen gewerkt bij Kadaster. RWS zal daarbij aansluiten. Aanstaande donderdag volgt er een volgende test en zal het risico SMARTer worden omschreven en van mitigerende maatregelen voorzien.
