



kadaster

Tactische Beheer Organisatie

Voortgang PI-27

sprint 5

Digitaal Stelsel Omgevingswet,

2023-09-05



Voortgang PI-27, sprint 5 (08/22-05/09)

ALGEMEEN:

De sprint is zo goed als volgens plan verlopen. Geen opmerkingen verder behalve dat er schot zit in het realiseren van het vorige keer genoemde performance issue bij de viewer (zie ook 'bekende problemen op de site bij het IPLO). De oplossing bestaat uit 3 delen. Een soort drietrapsraket. Het eerste deel is deze huidige sprint gelanceerd, het tweede deel komt met sprint 6 en het laatste deel in sprint 1 PI-28.

Release/Deployment:

Geen bijzonderheden bij de 27.5 release. Denk nog wel aan de vorige sprint afgestemde data mbt de migratie naar een private cluster van het RWS deel in de Oefen en productie omgeving.

- 08 september 2023 oefenomgeving
- 12 september 2023 productieomgeving.

(We verwachten alleen de ochtend van die dagen nodig te hebben, maar claimen de hele dag om voorbereid te zijn op herstelwerkzaamheden mocht dat nodig zijn. Er is rekening gehouden met het geplande gebruik van de omgevingen. De oefenomgeving wordt op een vrijdag gedaan wat doorgaans een rustige dagen is qua oefenen door de gezagen. De impact is daarmee het laagst. De informatie is in meer detail op de onderhoudskalender terug te vinden:

<https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2023/augustus/ip-adressen-veranderen-begin-september/>)

Risico proces:

In het PI Risico Overleg is de status van alle risico's bijgewerkt. Voornaamste risico is afhankelijkheid COR API gebleven en 2 nieuwe risico's zijn de top 3 binnengedrongen. Onzekerheid omtrent de ondersteuningsvraag en 'Foute' content in DSO-LV als gevolg van onzorgvuldige publicatie door BG's.




Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-27

	% gerealiseerd van het totaal PI	% van wat er gepland was t/m sp5	% gereed en gepland in sp5 alleen
Totaal DSO-LV	84%	98%	89%
Geonovum	71%	89%	63%
Kadaster	79%	98%	92%
KOOP	84%	99%	94%
RWS	89%	98%	91%
Programma	95%	100%	100%

N=genormaliseerd voor het # items per team

N sprint =93%

Burndown grafiek sprint 27.5

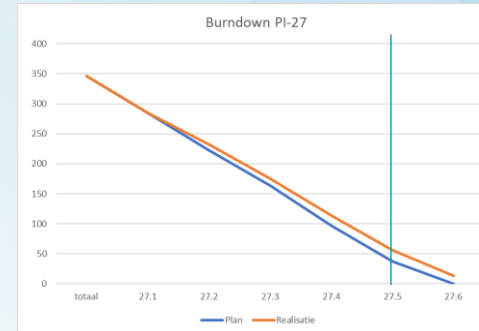

Bevindingen genoemd in PIBO

Kadaster
Geen aanvullingen.

Geonovum
Geen aanvullingen.

KOOP
Geen aanvullingen

RWS
Geen aanvullingen.

Top 3 risico's

- [DSO] Afhankelijkheid met de COR API van Logius. Api is niet stabiel genoeg.
Mitigerende maatregel: Team Knooppunt zal caching oppakken in PI-28. Martin zit op korte termijn met Logius om de tafel.
- [DSO] Onzekerheid omtrent de ondersteuningsvraag.
Mitigerende maatregel: Notitie omtrent Verhoogde Dijkbewaking is opgesteld met DVO. Deze notitie kan/zal worden gedeeld met het IRT (opschalen blijkt niet gemakkelijk). De 'nieuwe' ServiceKeten manager is vertrokken en er is op dit moment geen (extra) helderheid te verkrijgen.
- [GEO] 'Foute' content in DSO-LV als gevolg van onzorgvuldige publicatie door BG
Mitigerende maatregel: 1.) Vacature senior content coördinator staat uit; Chris, Maaik en Floris nemen regie om ism Gijs en virtueel contentteam besluitvorming te stimuleren op korte termijn en content coördinator in te werken. 2.) Praktijkafspraken voor OW-mutaties en niet meer kunnen wijzigen van anders dan eigen plannen moeten worden gepland voor volgend PI.


Verdieping realisatie per OBO team PI-27, sprint 5

Teams	27.4	27.5 plan	27.5 realisatie	%	status	Opmerking
PR33-TPOD	88%	8	5	63%		
PR30-LVBB	100%	18	17	94%		
PR2905 Knooppunt	100%	3	3	100%		
PR13U-RTR	100%	1	1	100%		
RWS content	50%	4	4	100%		
UX	133%	3	3	100%		
PR06-Catalogus	80%	6	5	83%		Uitval wegens ziekte: ZBP Angular migratie loopt door t/m 28.1, daardoor wordt ook de WCAG test ZBP opgepakt in PI-28
PR31-OZON	100%	4	4	100%		
PR02-Loket	100%	6	5	83%		
DSO-Viewer	100%	2	2	100%		Viewer Performance issue met grote plannen speelt nog steeds maar er is een oplossing bedacht. Deze zal in 3 stappen gaan. Deze sprint de eerste sp 6 de tweede en sprint 28.1 de laatste.
IHR	100%	1	1	100%		
PR12G-Gebr.Toep	88%	8	7	88%		Sprintboot update loopt net wat door in sprint 6. IVM vele gewijzigde en vervangen componenten willen we een goede regressietest doen voordat we deze opleveren. Minio is nagenoeg gereed, maar wordt ook in sprint 6 afgerond.
RWS Beheer	100%	1	1	100%		
Monitoring		0	0	100%		
totalen	94%	65	58	89%		

Tot PI **84%**



Risico's PI-27

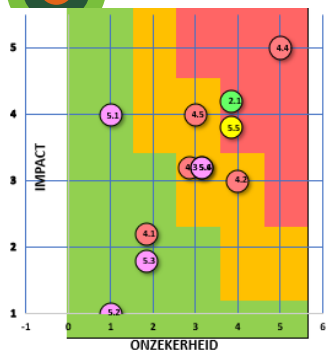

1. Optimaliseringsbevestigingen: ICT en overleg
2. Ondersteunen en oefenen en implementeren
3. Compleet maken, afgeleide inclusie en exclusie
4. Overzicht maken van functioneleiteit
5. Anders



overlijden	ID	Risico omschrijving	eigenaar	toelichting oorzaak onzekerheid	toelichting impact	0	1	So	mutatie	toelichting en actie	
f	ll	onderwerp	eigenaar	toelichting onzekerheid	toelichting impact	0	1	score	mutatie	toelichting en actie_6	
1	3	4.1 [KAD] Verwachtingsmanagement demand/supply voor monitoring	ArieD	Verwachtingsmanagement is onvoldoende ingericht	Teluurstellingen v.w.b. de te bouwen functionaliteit of de voortgang daarop	2	2	4		Structurele meeting is ingericht en de verwachtingen zijn helder. Het is van belang dat de features concreet zijn beschreven in volgorde van prioriteit (PI-28).	
2	4	4.2 [KAD] Overstap naar Shadow dom; complexiteit en toekomstvastheid o.a. Viewer	PM		Veel complexiteit en impact en toekomstvastheid voor zowel de Toolkit, Viewers als Zelfbedieningsportaal Stelselcatalogus	4	3	12		Voor IWT kan er niet van Shadow dom worden afgeweken. Kadaster zal Shadow dom moeten incorporeren in de PI-28 (of PI-29) planning. Wanneer dat onmogelijk blijkt moet er naar andere oplossingen worden gekeken.	
3	6	4.3 [KAD] Robuustheid en stabiliteit Viewer i.r.t. gevraagde nieuwe functionaliteit	PM	nieuwe functionaliteit blijft gevraagd / verwacht	De te leveren functionaliteit kost meer tijd om te realiseren	3	3	9		update volgt zsm. Er zijn meerdere 'moettes' voor de Viewer(s).	
4	1	4.4 [DSO] Afhankelijkheid met de CDR API van Logius	MartinB	API is niet stabiel genoeg. De planning is onzeker. Wat houdt de nieuwe functionaliteit in?	Twee teams van RWS zijn afhankelijk van deze API. Functionele impact op beschikbaarheid geldt ook voor meer dan PI-25/26/27	5	5	25		Knooppunt zal caching oppakken in PI-28. Martin zit op korte termijn met Logius om tafel.	
5	4	4.5 [DSO] Concurrent Versioning (in de Plan-kenen)	Peter, Maaike	De ontwikkeling van Concurrent Versioning gaat te lang gaat duurt (te late start en te lange duur)	Nieuwe standaarden (met name STOPB) kunnen niet tijdig worden geïmplementeerd. (bepaalde besluiten kunnen niet binnen DSO-LV worden verwerkt)	3	4	12		Er wordt onderzocht of het meer Agile kan worden aangepakt: STOP2.0 en Concurrent Versioning. Het blijft complex.	
6	2	2.1 [DSO] Onzekerheid omtrent de ondersteuningsvraag	PM	Onduidelijk welke vragen er op ons af komen en er is nog onvoldoende uitgewerkt welke dienstverlening we daarvoor moeten bieden.		4	4	16	analoog, impact, amloog	Notitie omtrent Verhoogde Dijkbewaking is opgesteld met DVD. Deze notitie kan/zal worden gedeeld met het IRT (opschalen blijkt niet gemakkelijk). De 'nieuwe' Serviceketen manager is vertrokken en er is op dit moment geen (extra) helderheid te verkrijgen.	
7	9	5.1 [DSO] Het DSO kent beschikbaarheidsproblemen	TBO	Het DSO bestaat uit veel componenten en wordt beheerd door verschillende partijen en ieder met een eigen SLA.	Daardoor is de kans aanwezig dat bij uitval van een component (en een mogelijke kettingreactie) het DSO langere tijd niet beschikbaar is maar alle componenten op zich zelf wel de afgesproken SLA voor het specifieke component halen.	1	4	4		DSO-LV presteert over het algemeen binnen de SLA. Er is uiteraard af en toe wel 'outage' o.a. i.r.t. gerobotiseerd 'testen'. @Martin is hierover in gesprek met oa Alevander H. > in het risico opgevoeren > risico 13	
8	12	5.2 [RWS] Performance issues	Margriet	Het is niet inzichtelijk hoe het systeem performed bij een grote load. Daarnaast is het nog onduidelijk hoe het systeem performed als de databases worden gevuld.	DSO is niet of verminderd beschikbaar. Imago- en financiële schade.	1	1	1	1	analoog, impact, amloog	Het specifieke risico is voldoende opgepakt door het team. Dit wordt ondersteund vanuit het Performance dashboard.
9	9	5.3 [RWS] Risico van dataverlies door onbekende prestaties van MiniID bij back-ups.	Magriet	Met betrekking tot het maken van back-ups is nog onbekend of de performance van MiniID voldoende is.	Hierdoor kunnen back-ups mogelijk niet goed gemaakt worden met als gevolg dataverlies.	2	2	4	analoog, impact, amloog	Het risico zat voor een deel in het 'onbekende' en dat risico is inmiddels afgenomen. Er is ruime aandacht voor Backup-Recovery. Er wordt nog navaag bij de teams gedaan	
10	6	5.4 [KOOP] Migratie naar Standaard Platform	Paul M	Het contract met de huidige provider loopt af en kan niet meer verlengd worden. Dit is niet specifiek maar KOOP breed.	Drie maanden voor en drie maanden na IWT is er geen mogelijkheid voor een transitie van de LVBB naar een nieuwe technische infrastructuur.	3	3	9		Vooralsnog is de verwachting dat de PROD in oktober gemigreerd is. PFE en ACC in september/oktober. Volgens planning.	
11	##	4.6 [RWS] Uitstel migratie naar ShadowDom door Kadaster	PM	Uitstel migratie van de viewer naar ShadowDom door Kadaster	Het gevolg is, dat daarmee het loket langer 2 platformen (ShadowDom en Iframes) moet ondersteunen. Gezien de complexiteit van beiden leidt dat tot een grotere kans op fouten en instabiliteit, alsmede extra beheer, onderhoud en testen.	0	0	0	analoog, impact, amloog	zie risico 2/4.2 Er is geen impact voor W/CAG	
12	2	5.5 [GEO] 'Foute' content in DSO-LV als gevolg van onzorgvuldige publicatie door BG	Jitske	onzorgvuldige content / - publicatie of mutatie van content van andere BG's	als gevolg van 1.) geen content-coördinator en 2.) onzorgvuldige publicaties	4	4	16	nieuw	1.) Vacature senior content coördinator staat uit; Chris, Maaike en Floris nemen regie op ism Dijs en virtueel contentteam besluitvorming te stimuleren op korte termijn en content coördinator in te werken. 2.) Praktijkspraken voor DW-mutaties en niet meer kunnen wijzigen van anders dan eigen plannen moeten worden gepland voor volgend PI.	
13	6	5.6 [DSO] Korte 'outage' leidt tot negatieve publieke opinie.	PM	onbekene oorzaken	SLA's worden niet (meer) gehaald / negatieve publieke opinie.	3	3	9	nieuw	Opgevoerd als spin off van risico 7/5.1	
