



kadaster

Tactische Beheer Organisatie

Voortgang PI-29

sprint 3

Digitaal Stelsel Omgevingswet,

2024-02-22



Voortgang PI-29, sprint 1 t/m 3 (06/02 – 20/02)

ALGEMEEN:

Geen problemen gemeld door de teams.

Metrics afgeven is voor dit PI niet goed te doen. Een aantal teams heeft een erg agile werkvorm voor bv het oplossen van bugs. Een ander groot aantal heeft de meeste features staan op 'klaar in sprint 5' en er is een groot aantal beheerfeatures met inzet op... Hiervan is het moeilijk een kwantitatieve voortgang te geven op programmaniveau. Het zou veelal resulteren in 100% gereed (inzet/ondersteuning/beheer) tot 0% (bugs met meer prioriteit aan boord genomen dan oorspronkelijk gepland).

De voortgang zal daarom de rest van het PI kwalitatief zijn. Met een paar teams wordt gekeken naar een zinvolle rapportage mogelijkheid met ingang van PI-30. Voor het begin PI-30 zal dat afgestemd en toegelicht worden.

Release/Deployment:

Deployments lopen goed. De verschillende componenten van Kadaster rollen veelal wekelijks uit zonder onderbreking van de dienstverlening. RWS is terug op uitrol per sprint. Zoveel mogelijk buiten kantoor tijd, maar als de doorlooptijd langer ook wel tijdens. Altijd met onderhouds berichten op de website. De SLA staat dit ook nog steeds toe. Morgen de Beek release tussen 08:00 en 09:00 uur. LVBB zal met de SP migratie een uitrol doen om weer om 'het been bij te trekken'. Er zullen dan veel bugfixes gedaan worden. Planning voor productie is dat de SP migratie 28 en 29 maart gedaan zal worden.

Risico proces:

Toelichting Wim






Verdieping realisatie per OBO team PI-29, t/m sprint 3

Teams	status	Opmerking
PR33-TPOD		
PR30-LVBB		
PR2905 Knooppunt		
PR13U-RTR		
RWS content		
UX		
PR06-Catalogus+IHR		
PR31-OZON		
PR02-Loket		
DSO-Viewer		
IHR		
PR12G-Gebr.Toep		Door nieuw gevonden bugs rond indienen met complexe situaties hebben we veel uitgezocht samen met pr2950 en pr13. Mede daardoor hebben we veel zaken moet doorschuiven naar een volgend increment. We blijven proberen om 'opslaan vergunningcheck en maatregelen op maat' nog wel volgens planning eind sprint 5 op te leveren.
Arch.Runway		
RWS Beheer		
Monitoring		Verder gegaan met uitgebreider documenteren. Verdere analyse op BZK/VNG dashboard. Doorontwikkeling bestaande dashboards/rapportages. Kennisdeling
Toolkit		





Risico's PI-29

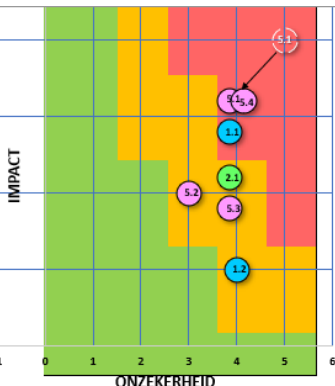

r.	o	l.	onderwerp	eigenaar	oorzaak onzekerheid	toelichting impact	score	mutati	toelichting en actie
1	3	2.1	[KAD, RWS] Overstap naar Shadowdom; complexiteit, onderlinge afhankelijkheid en beheerlast	JR, MR		meer complexiteit, onderlinge afhankelijkheid en tijdelijk meer beheerlast	4* 3	12	De Stelselcatalogus Zelfbedieningsportaal is vorig jaar overgestapt, overstap Viewer is gestopt ivm veel meerwerk en risico's. Architecten zijn in gesprek (Er bestaat verschild van mening over Shadowdom). Traject verloopt moeizaam. Besluit is noodzakelijk, maar impact is deels nog onduidelijk! Beslisnotitie 26 febr klaar @PvP.
2	1	5.1	[DSO] Afhangelijkheid met de COR API van Logius	MB	API is niet stabiel genoeg.	Functionele impact op beschikbaarheid.	4* 4	16	Op 6-2 gesproken met Logius. In PI-29 zal de caching/cloning worden opgeleverd (beschikbaarheidsissue). Er bestaat ook nog een datakwaliteits-issue . Is de COF voor de lange termijn de juiste tool? Dat datakwaliteits-issue blijft overeind. Er is echter een afhankelijkheid van vele partijen. Zodra caching/cloning is ingeregeld zal risico rond datakwaliteit nog meer aandacht krijgen.
3	1	1.1	[GEO, RWS] 'Foutie' content in DSO-LV als gevolg van onzorgvuldige publicatie of nog onbekende variaties door BG	JB	onzorgvuldige publicaties	onzorgvuldige content / - publicatie of mutatie van content van andere BG's. Performance problemen geo of historisch verwijderde activiteiten.	4* 4	16	Directe mutaties kan inmiddels niet meer. Ozon is druk bezig met de implementatie van 'toekennen van objecten aan regelingen', dat gaat dit risico ook deels mitigeren. Daarna kan dit risico worden afgevoerd wat bijvoorbeeld foutieve data in plannen kan vanuit DSO-LV niet worden voorkomen.
4	6	1.2	[DSO] afhandeling content meldingen bij helpdesk	AD	Meldingen over bijvoorbeeld vragenbomen komen binnen. IPLD wil in dat geval een signaal sturen naar de content eigenaar, maar beschikt niet over actuele contactgegevens bij alle overheden.	informatieverlies/vertraging bij verbeteren vragenbomen. In bredere zin: afbreukrisico reputatie. Omgevingsloket etc mogelijk verloren gaan van waardevolle signalen.	4* 2	8	@Wim: Arie vragen naar stand van zaken
5	5	5.2	[KOO] Vanwege mogelijke vertraging (na IWT) in de migratie naar het Standaard Platform stropen gerelateerde andere releases op.	PM	Transitie naar SP loopt uit.	Gerelateerde releases binnen DSO-LV Programma stropen op. Gewenste / benodigde functionaliteit wordt uitgesteld etc later gereleased.	3* 3	9	Inmiddels is voor SP de uitrol naar Acc afgerond. Voorlopige data voor PRE: 13/14 maart en PROD: 29/30 maart. Risicoscore blijft staan tot afronding uitrol op PROD..
6	3	5.3	[RWS] Kleine incidenten etc onderwerpen 'buiten' worden onnodig groot gemaakt en leiden tot onrust of ongewenste acties en activiteiten binnen.	MR	Politieke paniek rond bijvoorbeeld WKB (Cobouw).	onrust of ongewenste acties en ad hoc activiteiten (breaking changes) binnen het DSO-LV programma.	4* 3	12	Dit is nog steeds een risico / issue.
7	1	5.4	[DSO] Het budget 2024 is niet beschikbaargesteld.	MP	niet tijdig beschikbaarstellen van de financiering / middelen voor 2024	Onzekerheid over het uitvoeren van de plannen / (voorzien) epics. Vastlopen voortbrengingsproces etc tijdig opleveren juiste features	4* 4	16	onzekerheid omhoog, impact omhoog
